PELFA group

ILVA SPA STABILIMENTO DI TARANTO

IMPIANTO DI DEPOLVERAZIONE GRF

PROGRAMMA MONTAGGI

ID	Nome attività	Inizio	Fine
1	Preparazione cantiere e inizio ripristino parti danneggiate	29/01/2018	21/02/2018
2	Montaggio meccanico cappa n°1	22/02/2018	06/04/2018
3	Montaggio meccanico cappa n°2	09/03/2018	27/04/2018
4	Montaggio tamponamenti e finiture cappa n°1	19/03/2018	30/05/2018
5	Montaggio parte elettrica ed automazione cappa n°1	31/05/2018	22/06/2018
6	Montaggio tamponamenti e finiture cappa n°2	26/03/2018	06/06/2018
7	Montaggio parte elettrica ed automazione cappa n°2	07/06/2018	29/06/2018
8	Montaggio impianto di depolverazione e camino	23/04/2018	31/08/2018
9	Realizzazione parte elettrica e automazione filtro	10/08/2018	30/09/2018
10	Montaggio Travel Vent	09/07/2018	31/07/2018
11	Prove ed avviamento impianto	01/10/2018	15/11/2018
12	Commissioning	16/11/2018	31/12/2018

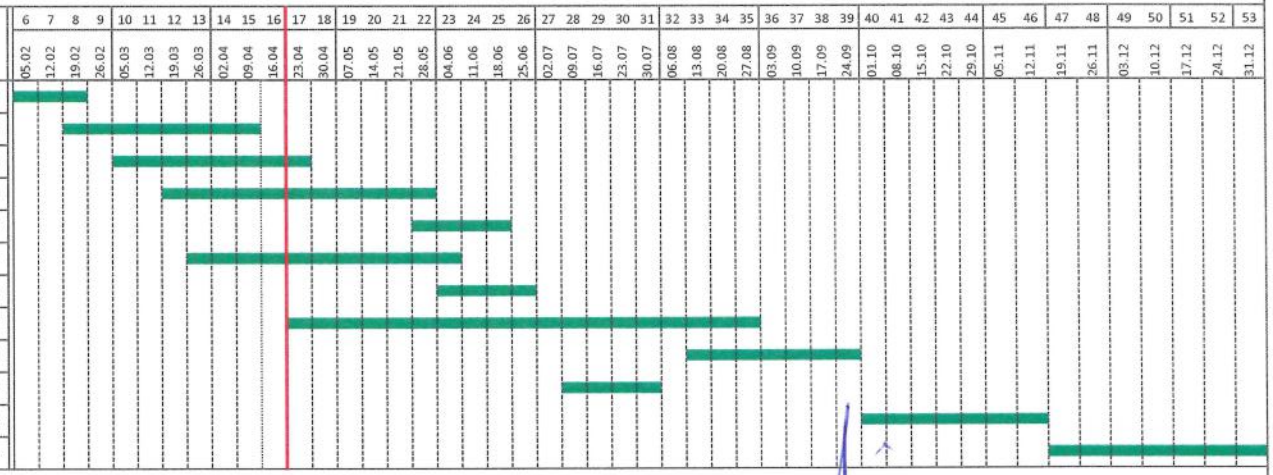

REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	PREPARATO DA	CONTROLLATO DA	APPROVATO DA
0	16.04.2018		De Monte	Ceschiutti / Cuberli	Forgiarini

PELFA GROUP S.R.L.
Sede legale: Corso Italia n. 45
20122 MILANO (MI)
Uffici: Via Europa, 12/b - 33030 BUJA (UD)
C.F./P.IVA e Nr. Iscr. Reg. Imp. MI.: 05547380963
